

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenador
30/10/2024 (João Pessoa/PB)	Início	-	Término	-	Reunião eletrônica	Lindinaldo Silva Marinho

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Lindinaldo Silva Marinho	JAP	Juiz Auxiliar da Presidência
Hyderlandson Coelho da Costa	SGP	Secretário-Geral da Presidência
Simone Farias Perrusi	GDG	Diretora-Geral da Secretaria
Renan Cartaxo Marques Duarte	Segejud	Diretor da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Bruno Rafael de Araújo Sales	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ozanete Gondim Guedes Pereira	VT13JPA	Diretora de Secretaria da 13ª Vara do Trabalho
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança da Segurança da Informação

3. PAUTA DA REUNIÃO

- 3.1. Painel de Indicadores de TIC 2024
- 3.2. Monitoramento do PDTIC - Ações/Projetos 2024
- 3.3. Monitoramento do PDTIC - Capacitação 2024
- 3.4. Monitoramento do PDTIC - Contratos e orçamento 2024
- 3.5. Monitoramento do Plano de Transformação Digital 2023/2024
- 3.6. Monitoramento do Plano Diretor de Governança de TIC 2024

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Foram apresentadas as seguintes informações para os membros do CGOVTIC:

- Painel de Indicadores de TIC 2024
- PDTIC - Ações/Projetos 2024
- PDTIC - Capacitação 2024
- PDTIC - Contratos e orçamento 2024
- Plano de Transformação Digital 2023/2024
- Plano Diretor de Governança de TIC 2024

Deliberação do Comitê: Não havendo manifestação em contrário, o comitê aprovou os planos e indicadores na forma que foram apresentados.

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS

- 6.1. Indicadores de TIC 2024
 - 6.1.1. Ações e Projetos
 - 6.1.2. Capacitação
 - 6.1.3. Plano de Transformação Digital
 - 6.1.4. Orçamento
- 6.2. PDTIC - Ações e Projetos 2024
- 6.3. PDTIC - Capacitações 2024
- 6.4. PDTIC - Contatos e Orçamento 2024
- 6.5. Plano de Transformação Digital 2023/2024
- 6.6. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

LINDINALDO SILVA MARINHO Juiz Auxiliar da Presidência Coordenador	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator
---	--

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

SISTEMAS LOCAIS

82,61%

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

77,78%

SISTEMAS NACIONAIS

75,00%

GESTÃO

73,33%

INFRAESTRUTURA

71,43%

ATENDIMENTO

53,85%

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

38,46%

TEMA

Todos

TRIMESTRE

Todos

TIPO

Todos

CONCLUÍDO

Todos

69,09%

Executado

76

Concluído


110

Previsto

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.
ATENDIMENTO	Ação	Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque
ATENDIMENTO	Ação	Criação da Imagem dos computadores Dell
ATENDIMENTO	Ação	Criação de uma Base de Conhecimento do Pje
ATENDIMENTO	Ação	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras
ATENDIMENTO	Ação	Revisão da Política de Gerenciamento de Patches
ATENDIMENTO	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de
ATENDIMENTO	Ação	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO
ATENDIMENTO	Ação	Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com maq
ATENDIMENTO	Ação	Solução com arduino para economia de energia elétrica
ATENDIMENTO	Ação	Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (fase 1)
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 2)
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1
GESTÃO	Ação	Auditoria nos chamados de incidentes, requisições e RDM
GESTÃO	Ação	Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMs
GESTÃO	Ação	Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis
GESTÃO	Ação	Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega
GESTÃO	Ação	Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos

- Ações e Projetos
- Pessoal
- Capacitação
- PTD
- Orçamento
- Contratos
- iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

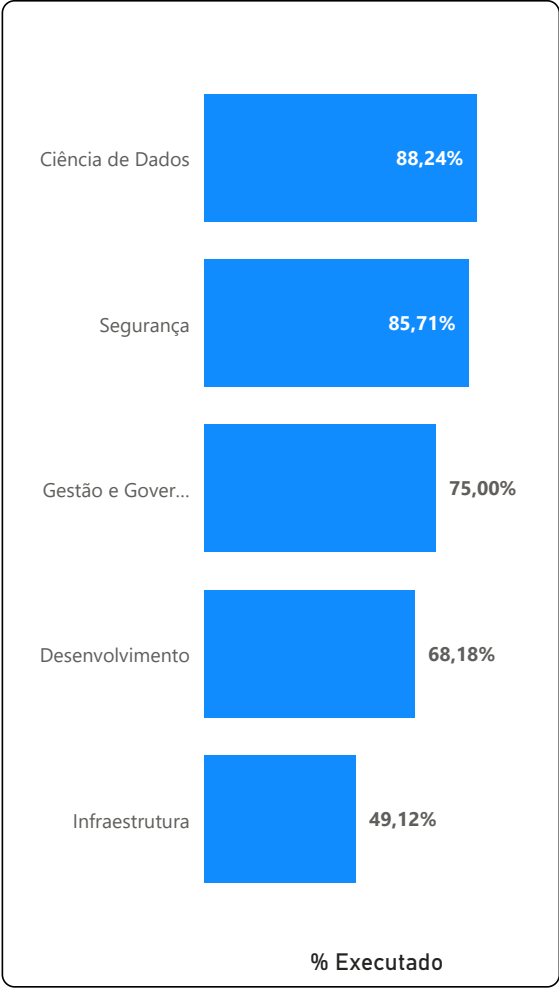

Tema

Todos

Previsão

Todos

66,17%

Executado

133

Realizado

201

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	1	1
Ciência de Dados	Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h]	3	2
Ciência de Dados	Curso MLflow in Action - Master the art of MLOps using MLFlow tool	1	1
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]	1	1
Ciência de Dados	Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário	1	1
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	1	1
Ciência de Dados	LLamaIndex [4,5h]	1	1
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	4	4
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	1	
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	2	2
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	1	1
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	1	1
Desenvolvimento	Banco de Dados	1	1
Desenvolvimento	Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h]	1	1
Desenvolvimento	BI	1	1
Desenvolvimento	Clean Code [6,5h]	6	2
Desenvolvimento	Curso UX/UI (udemy) [20h]	24	12
Desenvolvimento	DevOps	1	1
Desenvolvimento	DevOps	2	2
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	2	
Desenvolvimento	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado	1	1
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h]	2	

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

PTD


Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

Plano de Transformação Digital 2023/2024

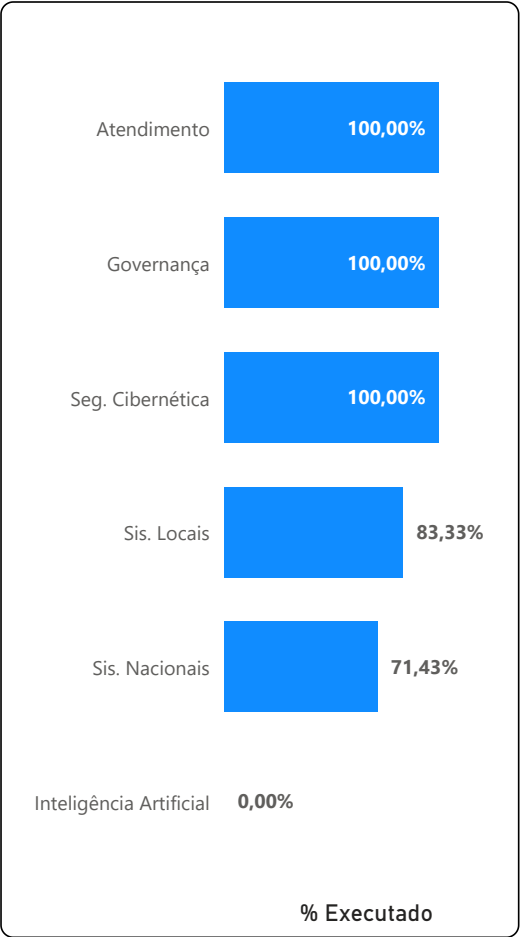

Tema

Todos

Concluído

Todos

75,00%

Executado

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUÍDO	CONCL
Atendimento	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	dez./2023	Sim	dez./2023
Atendimento	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	dez./2023	Sim	nov./2023
Atendimento	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	dez./2023	Sim	nov./2023
Governança	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	dez./2023	Sim	set./2023
Inteligência Artificial	Experimentos para geração da ementa dos votos com LLMs open-source	dez./2024	Não	
Inteligência Artificial	Mapeamento dos autotextos relativos a cada pedido da inicial	dez./2024	Não	
Seg. Cibernética	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	dez./2023	Sim	nov./2023
Sis. Locais	Acessibilidade dos Portais	jul./2023	Sim	jul./2023
Sis. Locais	Aprimoramento do Portal do PJE	out./2023	Sim	out./2023
Sis. Locais	Criação de aplicativo para realização de inventário	set./2023	Sim	set./2023
Sis. Locais	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	mar./2023	Sim	mar./2023
Sis. Locais	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	jun./2023	Sim	mai./2023
Sis. Locais	SEGEPE - Meu portal	dez./2024	Não	
Sis. Nacionais	Implantação do app SIGEP-JT	jun./2023	Sim	fev./2023
Sis. Nacionais	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	mar./2023	Sim	mar./2023
Sis. Nacionais	Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)	set./2024	Não	
Sis. Nacionais	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	jul./2023	Sim	jul./2023
Sis. Nacionais	Implantação robôs do solaría (RJ9)	set./2024	Sim	jul./2023
Sis. Nacionais	Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe	dez./2024	Não	
Sis. Nacionais	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	set./2023	Sim	out./2023

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

PTD



Orçamento

Contratos


iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024



Custeio



Investimento



Total

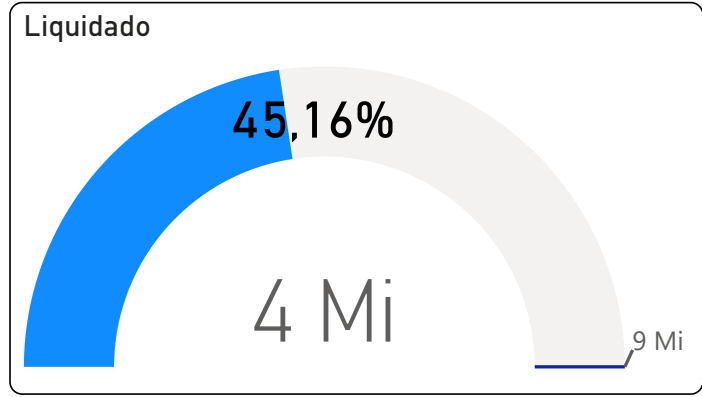

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
ATENDIMENTO	Ação	Revisão da Política de Gerenciamento de Patches	18/10/2024	Dez/2024			Concluído	Sim	4	Não
ATENDIMENTO	Ação	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO	10/09/2024	Jun/2024	SETIC	Risco de atraso devido a sobrecarga de trabalho com o responsável pela atividade.	Concluído	Sim	2	Não
ATENDIMENTO	Ação	Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1	12/07/2024	Mar/2024	SETIC	Pendentes apenas poucos computadores cujo servidores e magistrados encontra-se ausentes.	Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas	12/06/2024	Mar/2024	SETIC	Pendente apenas apresentação a Gestão.	Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Criação de uma Base de Conhecimento do Pje		Não Priorizado			Backlog	Não	0	Não
ATENDIMENTO	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.		Jun/2024			Priorizado	Não	2	Sim
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (fase 1)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Criação da Imagem dos computadores Dell	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC		Mar/2024	SETIC		Em andamento	Não	1	Sim
ATENDIMENTO	Ação	Solução com arduíno para economia de energia elétrica		Jun/2024	SETIC	Atrasos devidos ao andamento de outras tarefas e demandas urgentes	Em andamento	Não	2	Sim
ATENDIMENTO	Ação	Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque		Jun/2024	SETIC	Risco de atraso na implantação por conta da exoneração de Ranieri.	Em andamento	Não	2	Sim
ATENDIMENTO	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 2)	10/06/2024	Jun/2024	SEGEJUD	Adaptando a tela de login. Adicionando "Esqueci minha senha" e link para FAQ.	Concluído	Sim	2	Não
ATENDIMENTO	Ação	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras		Dez/2024	SETIC	Risco de atraso, aguardar chegada dos suprimentos necessários, adquiridos pelo CMP como material de consumo	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Migração do Mentorh para o SIGEP - Fase 1	11/10/2024	Set/2024	SEGEPE	Migração dos dados concluída. Está sendo feito uma conferência a fim de garantir que todos os dados foram migrados	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Implantação PJe 2.11	28/09/2024	Set/2024	CSJT	Implantação prevista para o dia 28/09/24	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação robôs do solaria (RJ9)	01/08/2024	Set/2024	SCR	Execução da ação iniciada antecipadamente	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (3ª etapa)	30/06/2024	Jun/2024	CSJT	A etapa de desenvolvimento do piloto será finalizado no 2º trimestre conforme planejado. O programa StartupJt irá até o final de julho. Durante esse mês, as demandas relativas a StartupJT serão tratadas como operação (apenas correção de defeitos)	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Gestão - Piloto (3ª etapa)	30/06/2024	Jun/2024	CSJT	A etapa de desenvolvimento do piloto será finalizado no 2º trimestre conforme planejado. O programa StartupJt irá até o final de julho. Durante esse mês, as demandas relativas a StartupJT serão tratadas como operação (apenas correção de defeitos)	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Implantação módulos SIGEP: DMAG, GAA e GECJ	30/06/2024	Jun/2024	SEGEPE	Sistema implantado em produção por ordem de Dr. Lindinaldo.	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Incorporação da Startup PJe Gestão no PJe		Dez/2024	CSJT	Projeto atrasado, aguardando definições do CSJT quanto a formalização do projeto e definições internas da SETIC	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	SAPI - Autoatendimento	30/06/2024	Mar/2024	SETIC	- Finalizado, aguardando agenda para apresentação ao 1º nível e Ilha Service	Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Migração do Mentorh para o SIGEP - Fase 2		Dez/2024	SETIC	Estão sendo desenvolvidos relatórios no SAO Adm para consultar os dados migrados na fase 1	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	PJe Ver. 2.10 - Implantação	31/01/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Evolução SAO - Implementação do Segundo Fator de Autenticação		Set/2024	CSJT	Durante a geração da versão do SAOADM com o 2FA, verificou-se um defeito no sistema que precisará ser corrigido antes da conclusão do projeto	Em andamento	Não	3	Sim
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Plugin para inclusão de voto vencido no PJe 2º grau	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)		Set/2024	SEGEJUD	O painel e o extrator de dados foram instalados, porém existe um problema na atualização automática dos dados que não está ocorrendo devido a problemas na máquina que faz a publicação dos painéis na nuvem do CSJT.	Em andamento	Não	3	Sim
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - Pje Gestão - Piloto (2ª etapa)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Projeto	Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (2ª etapa)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS NACIONAIS	Ação	Análise dos módulos DMAG, GAA e GECJ	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequação aplicações legadas ao uso de 2FA - Fase 2	30/10/2024	Dez/2024		Baixo: Dado que estamos aprimorando nosso know how de lançamento de aplicações legadas no keycloak	Concluído	Sim	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Novo portal da SEGEPE	11/10/2024	Set/2024		Médio - Time está trabalhando nas mudanças pedidas pela Segepe/ACS	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequação aplicações legadas ao uso de 2FA - Fase 1	27/09/2024	Set/2024		Baixo - Falta apenas o sisrec, mais crítico e tecnologia diferente	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Dashboard para gestão de produtos (Módulos de Usuários e de Serviços)	27/09/2024	Set/2024		Médio - Backlog melhor estabelecido, em desenvolvimento	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do Módulo ROL do SIGEP	10/09/2024	Set/2024	SEGEPE	Baixo - Sistema já está em produção, faltam poucos detalhes	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do módulo de prova de vida	10/09/2024	Set/2024		Muito baixo - O maior risco era a integração com o gov.br, mas já foi concluído.	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do SMD em homologação - Sistema de Monitoramento de Desempenho (TRT14)	05/09/2024	Set/2024	GVP	Muito baixo - Término do projeto deve ocorrer esta semana	Concluído	Sim	3	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Solução genérica para avaliação dos produtos de TIC	28/06/2024	Jun/2024	SETIC	Sistema finalizado - Trabalhando na confecção da notícia	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo do Módulo ROL do SIGEP	21/06/2024	Jun/2024	SEGEPE	Estudo finalizado	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo para migração do portal da INTERNET		Dez/2024		Risco Baixo: O objetivo do estudo é aprimorar a estratégia para melhor começar a fazer a migração do portal da Internet	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Novo Portal da SEGEPE - Avaliação técnica do Drupal	10/06/2024	Jun/2024	SETIC	Normal	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Dashboard de estatísticas da Central de Atendimento da SEGEPE		Dez/2024		Reunião de kickoff agendada para 01/10.	Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Atualização do PROAD	07/06/2024	Jun/2024	OUVIDORIA	Baixo	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	SEGEPE - Meu portal		Dez/2024			Em andamento	Não	4	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Soluções para automatização das substituições de FC e progressões de servidores	03/06/2024	Jun/2024		Baixo	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Implantação do SAF	24/05/2024	Jun/2024	SEGEPE	Baixo	Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	30/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26/27/29 (2ª etapa)	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Projeto	Eliminação de alimentação manual das informações referentes às páginas da transparência.	29/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo melhor ferramenta portal	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Estudo sobre migração de acervo físico dos assentamentos funcionais	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Adequações no portal da Transparência para Ranking da Transparência	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
SISTEMAS LOCAIS	Ação	Importação de arquivos digitalizados para o SAF		Dez/2024		Médio - Os arquivos estão sendo disponibilizados pela empresa contratada. É comum encontrarmos alguns problemas, como nome de classificações incorretos, mas acreditamos que nada que não possa ser superado.	Em andamento	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Ideação do Novo Portal da SEGEPE e Meu Portal	20/09/2024	Jun/2024	SEGEPE	Protótipo de baixa aprovado pela SEGEPE. Protótipo de alta sendo desenvolvido. Previsão: 30 Setembro	Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Prototipação visual de dashboards para a gestão de produtos	31/05/2024	Jun/2024		Protótipo Concluído	Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Imersão ágil e mapeamento de desafios na SEGEPE - Visitas a outros regionais e geração do relatório final	30/06/2024	Jun/2024	JAP	Visita ao TRT-14 agendada para 17 a 21/06.	Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Modelar Workshop de UX e UI	30/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Projeto	Implantação da Central de Serviços da SEGEPE		Set/2024	JAP	Ações relativas à SETIC concluídas. Cronograma em atraso, especialmente em relação às ações relativas à reforma.	Em andamento	Não	3	Sim
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos	04/05/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Reestruturação do catálogo de serviços para adequação à gestão por produtos		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMS		Set/2024	SETIC	Modelo definido. Foi definida uma squad piloto para testar o modelo no 4º trimestre.	Em andamento	Não	3	Sim
GESTÃO	Ação	Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos	30/04/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Auditoria nos chamados de incidentes, requisições e RDM		Dez/2024	SETIC	Planejamento pronto. Será executado a partir do início de Outubro.	Em andamento	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis	29/02/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1	30/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Imersão e mapeamento de desafios na SEGEPE / Folha de Pagamento (Etapas 1 e 2)	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implantação da solução de WAF + CDN (PJe)	18/10/2024	Set/2024	SETIC	Implantado.	Concluído	Sim	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Avaliar alternativas de soluções de virtualização	26/09/2024	Set/2024	SETIC	PoC com a Oracle muito adiantada, faltando apenas testar a integração da solução com nossa ferramenta de backup.	Concluído	Sim	3	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implantação da solução de WAF + CDN (Portal)	09/09/2024	Mar/2024	SETIC	Implantado na data do dia 09/09.	Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Ativação do Spanning-Tree	30/06/2024	Dez/2024	SETIC	Finalizado.	Concluído	Sim	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Extensão de garantia do Blade HPE	16/07/2024	Jun/2024	SETIC	A proposta inicial veio bem acima do esperado, o que implicou mais tempo dedicado à pesquisa de mercado e à análise de viabilidade da contratação. Porém, o prazo continua o mesmo.	Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Elaboração de ETP e TR - Roteadores para links de dados	29/06/2024	Jun/2024	SETIC	Está correndo dentro do prazo. Necessário fazer alguns ajustes, pois foram solicitados novos itens por outros TRTs. Dado que foram solicitados novos itens, uma nova consulta formal será necessária.	Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migração dos Storages		Dez/2024		Em andamento. Iniciado a conversa com a empresa fornecedora para alinhar os requisitos da pré-instalação.	Em andamento	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantar mobile access no firewall	11/05/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024								
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
INFRAESTRUTURA	Ação	ETP e TR para a contratação de manutenção preventiva e corretiva dos no-breaks da sala cofre.		Dez/2024	SETIC	Em andamento. Documentos elaborados e em revisão pelos integrantes técnico e administrativo da equipe. Deve ser despachado na primeira semana de novembro.	Em andamento	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Implementação de novo firewall	11/05/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Cópias de backups em local distinto do local primário		Dez/2024	SETIC	Em andamento. A contratação será efetuada por meio de uma ARP a ser publicada pelo JFPB. Provavelmente não será finalizada este ano.	Em andamento	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Implantação contínua em ambiente de homologação	14/05/2024	Set/2024			Concluído	Sim	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização de SO do cluster PJe	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização de SO do cluster ADM	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Realocação dos servidores em rack	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.		Set/2024	SETIC	Realizamos algumas atividades preliminares, mas com a saída de Adriana, essa atividade foi interrompida para que possamos focar em outras que consideramos mais importantes. Acredito que conseguiremos entregar em dezembro.	Em andamento	Não	3	Sim
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização e padronização do SO dos servidores	30/04/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Criar planos de restauração dos serviços essenciais		Set/2024	SETIC	Em andamento. Identificamos a necessidade de definir, em alto nível, o processo de backup e restauração de dados antes de prosseguir com a criação dos planos. Acredito que conseguiremos entregar em novembro.	Em andamento	Não	3	Sim
INFRAESTRUTURA	Ação	Desfazimento de equipamentos de TI obsoletos	07/05/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INFRAESTRUTURA	Projeto	Aprimorar procedimentos de testes de restauração		Set/2024	SETIC	Em andamento. Identificamos a necessidade de definir, em alto nível, o processo de backup e restauração de dados antes de prosseguir com a criação dos planos. A previsão é que seja concluída até o meio do mês de outubro.	Em andamento	Não	3	Sim
INFRAESTRUTURA	Ação	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	23/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de MFA no TRT	24/10/2024	Set/2024			Concluído	Sim	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC		Dez/2024			Em andamento	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	09/09/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Otimização do Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas, ativos e serviços		Dez/2024			Em andamento	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades	30/04/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Elaboração de procedimentos para testes externos dos sistemas Web	11/10/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	31/03/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo sobre infraestrutura para mitigação de vulnerabilidades		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC		Jun/2024			Em andamento	Não	2	Sim
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13		Dez/2024			Priorizado	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Suportar a CDSS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas		Set/2024			Em andamento	Não	3	Sim
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Estudo de solução para degravação de audiência	31/08/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Minuta de Relatório de Sentença - Versão 1.0	29/06/2024	Jun/2024			Concluído	Sim	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Rotulador 2.0	14/05/2024	Mar/2024			Concluído	Sim	1	Não

[illegible]



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO		
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Ewerton, Thommas, José Augusto	3	Ewerton, Thommas, José Augusto	3
Infraestrutura	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado	R\$ 0,00	Desenvolver habilidades para que administradores de sistemas consigam versionar a configuração da infra	2024	Helton	1	Helton	1
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [19h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/	R\$ 0,00	Desenvolver habilidades para que administradores de sistemas consigam automatizar tarefas de seu dia-a-dia	2024	Paulo, Wilberto, Ewerton, Thommas, Helton	5	Wilberto	1
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre administração do Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	2024	Wilberto	1	Wilberto	1
Infraestrutura	Netbox - Documentação de Redes [20,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/netbox-doc-redes/	R\$ 0,00	Documentar e gerenciar infraestrutura de TI, utilizando o netbox	2024	Adriana, Thommas	2	Adriana	1
Infraestrutura	AWS na prática [31,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pratica/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Ewerton, Paulo, Danillo, José Augusto, Thiago, Helton	6	José Augusto, Thiago	2
Infraestrutura	GitLab CI - Para Pipelines CI/CD & DevOps [4,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre os principais recursos disponíveis na AWS	2024	Danillo, Paulo, Thiago, José Augusto	4	Danillo, Thiago	2
Infraestrutura	AWX para Sysadmin [8h]	https://trt13br.udemy.com/course/awx-para-sysadmin/	R\$ 0,00	Capacitar os administradores de sistemas na disseminação do AWX como ferramenta de automatização	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, Ewerton	5	Ruber	1
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	Capacitar servidores para criar infraestrutura como código utilizando terraform	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto	4	Wilberto	1
Infraestrutura	Administrando o Google Workspace (G Suite) [14h]	https://trt13br.udemy.com/course/administrando-o-google-workspace-g-suite/	R\$ 0,00	Desenvolver competencias para gerenciar, implantar e administrar por completo o dominio dentro do Google Workspace	2024	Ruber, Wilberto	2	Ruber, Wilberto	2
Infraestrutura	Dominando Zabbix do básico ao avançado [10,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/dominando-zabbix-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	Aprimorar conhecimento da solução de monitoramento Zabbix	2024	Ruber, Wilberto	2	Ruber, Wilberto	2
Infraestrutura	Orquestração de Containers com Kubernetes [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/orquestracao-de-containers-com-kubernetes/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre a principal solução de orquestração de containers utilizada pelo mercado.	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, Ewerton, José Augusto, Thiago	7	Danillo, José Augusto	2
Infraestrutura	Curso Bacula [10,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/bacula-ferramenta-livre-de-backup/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre a principal solução de backup utilizada no TRT	2024	Ewerton, Helton	2	Ewerton, Helton	2
Infraestrutura	Engenharia de Redes - LAN (Local Area Networks) [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/engenharia-de-redes-lan/	R\$ 0,00	Capacitar servidores para projetar redes de computadores mais seguras e confiáveis.	2024	Adriana, Thommas	2	Adriana, Thommas	2
Infraestrutura	Active Directory - do Zero ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-do-zero-ao-avancado/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre administração do Active Directory	2024	Ranieri	1	Ranieri	1
Infraestrutura	Aprenda PowerShell do Zero [4h]	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-powershell-do-zero/	R\$ 0,00	Capacitar servidores sobre PowerShell	2024	Romulo Mendes	1	Romulo Mendes	1
Infraestrutura	Windows 11	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-o-windows-11-do-zero/	R\$ 0,00	Aprimorar conhecimentos no S.O Windows 11	2024	Alessandra	1	Alessandra	1
Infraestrutura	Treinamento Check Point Security Administration - CCSA	Curso ministrado pelo fornecedor da solução	R\$ 9.127,00	Administração básica da solução de firewall	2024	Ewerton, Helton, Thommas	3		
Infraestrutura	Treinamento Check Point Certified Security Expert - CCSE	Curso ministrado pelo fornecedor da solução	R\$ 9.129,00	Administração avançada da solução de firewall	2024	Ewerton, Helton, Thommas	3		
Infraestrutura	Desempenho e Troubleshooting em Redes de Computadores [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/desempenho/	R\$ 0,00	Identificar e isolar problemas de uma rede. Conhecer recursos e tecnologias que podem ser implementados para mensurar e elevar o desempenho de redes, servidores e aplicações.	2024	Adriana, Thommas	2	Adriana, Thommas	2
Segurança	EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.rnp.br/turma/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-3505/	R\$ 4.320,00	Capacitar sobre as vulnerabilidades de maior risco encontradas em sistemas web (OWASP Top Ten) e como elas podem ser exploradas por usuários maliciosos. Aprender técnicas para a realização de Pentest em aplicações web e conhecer ferramentas que podem otimizar o processo de Pentest, por meio da automatização de algumas tarefas.	2024	Manuel, Ricardo	2	Manuel, Ricardo	2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO		REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO	
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	https://conteudo.hackersdobem.org.br/		R\$ 0,00	Curso introdutório em Cibersegurança revisando conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e Desenvolvimento de Scripts	2024	Manuel, Ricardo	2	Manuel, Ricardo	2
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	https://conteudo.hackersdobem.org.br/		R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance	2024	Manuel, Ricardo	2	Manuel, Ricardo	2
Segurança	EJUD - Pentest+ EAD	https://esr.rnp.br/turma/pentest-ead-parceria-oficial-comptia-5882/		R\$ 5.000,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.	2024	Manuel	1		
Desenvolvimento	Banco de Dados	https://trt13br.udemy.com/course/advanced-sql-for-data-engineering/learn/lecture/38301852		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	BI	https://trt13br.udemy.com/course/curso-power-bi-estudos-de-caso		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	DevOps	https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-bootcamp/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Wagner	1	Wagner	1
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/drupal-tutorial/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael	1	Rafael	1
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/curso-php-7-online/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael	1	Rafael	1
Desenvolvimento	DevOps	https://trt13br.udemy.com/course/curso-docker/learn/lecture/7559920#overview		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Rafael, Sebas	2	Rafael, Sebas	2
Desenvolvimento	Programação	Course: Angular Core Deep Dive - Beginner to Advanced (Angular 17) UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1	Sebas	1
Desenvolvimento	Programação	Course: Angular Forms In Depth (Angular 17) UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1	Sebas	1
Desenvolvimento	Programação	Course: Angular Material In Depth (Angular 17) UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1		
Desenvolvimento	Programação	Course: REST API's RESTFul do 0 à AWS c. Spring Boot 3 Java e Docker UdemY Business		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Sebas	1	Sebas	1
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/flutter-bootcamp-with-dart/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas locais	2024	Gleydson	1	Gleydson	1
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/#overview		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Wagner Regis, Andrei	2		
Desenvolvimento	Selenium Webdriver with Java & TestNG Testir	https://www.udemy.com/course/selenium-webdriver-with-java-testng-testing-framework/?couponCode=ST22MT92324A				2024	Andrei	1		
Desenvolvimento	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/python-iniciantes-programacao/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2014	Vicente	1	Vicente	1
Desenvolvimento	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Fred	1	Fred	1
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master-apache-airflow/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Marcos Lins	1	Marcos Lins	1
Desenvolvimento	Clean Code [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Gustavo, Luiz Teixeira, Fred, Hugo, Andrei, Gouveia	6	Fred, Hugo	2
Desenvolvimento	Programação Python do Zero ao Avançado + 32 Projetos Reais [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/programacao-python-do-basico-ao-avancado/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Marcos Lins	1		
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Lucas, Evandro	2		
Desenvolvimento	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Bruno Coutinho, Lucas, Evandro, Marcos	4		
Desenvolvimento	Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners [33,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/spring-hibernate-tutorial/		R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Luiz Teixeira	1		



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Desenvolvimento	Sistema de Diárias e Viagens - Configuração e Usabilidade - Março/2024	Curso interno promovido pela EJUD13	R\$ 0,00	Capacitar servidores em sistemas nacionais suportados pela SETIC	2024	Caio	Caio
Desenvolvimento	Spring Security 6 Zero to Master along with JWT,OAuth2 [15h]	https://trt13br.udemy.com/course/spring-security-zero-to-master/	R\$ 0,00	Capacitar servidor em tecnologia de autenticação	2024	Ranieri	Ranieri
Desenvolvimento	Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h]	https://trt13br.udemy.com/course/banco-de-dados-oracle-completo-sqlplsqlmodelagem-de-dados/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	2024	Lucas	Lucas
Desenvolvimento	Curso UX/UI (udemy) [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/design-de-interface/	R\$ 0,00	Detalhar conceitos relacionados a experiência do usuário necessários para a ideiação de produtos. Esta capacitação é pré-requisito para a realização do Workshop de UX e UI, bem como para a execução da ação de ideiação do Portal da SEGEPE, ambas previstas no PDTIC	mai./2024	Ruggery, Cartaxo, Breno, Emerson, Miguel, Rafael, Dudu, Sebastião, Wagner, Gleydson, Jorge, Benjamin, Bruno Coutinho, Caio Caroca Frederico Guedes, Gustavo Wagner, Hugo Nóbrega, Luiz Teixeira, Rodrigo Gouveia, Wagner Regis, Elliackin, Jaqueline, Rômulo, André, Adriano	Frederico Guedes, Ruggery, Jaqueline, Emerson, Rafael, Wagner, Rômulo, Elliackin, Caio, Hugo, Bruno Coutinho, Gustavo Wagner
Desenvolvimento	Workshop UX/UI - UFC [30h]	Curso presencial contratado pela EJUD-13	R\$ 20.000,00	Formar profissionais na SETIC com habilidades em UX/UI	jun./2024	Adriano, André, Benjamin, Breno, Bruno Coutinho, Bruno Sales, Caio, Diemano, Elliackin, Emerson, Felipe, Frederico, Gustavo, Hugo, Jaqueline, Jorge, Gleydson, José Rafael, Lucas Ferreira, Luis Eduardo, Miguel, Paulo Sérgio, Rodrigo Cartaxo, Rômulo Figueiredo, Ruggery, Wagner Porto, Wagner Araujo, Rodrigo Gouveia	Adriano, André, Benjamin, Bruno Sales, Caio, Diemano, Elliackin, Emerson, Felipe, Frederico, Gustavo, Hugo, Jaqueline, Jorge, Gleydson, José Rafael, Lucas Ferreira, Luis Eduardo, Miguel, Paulo Sérgio, Rodrigo Cartaxo, Rômulo Figueiredo, Ruggery, Wagner Porto, Wagner Araujo, Rodrigo Gouveia
Desenvolvimento	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/dashboard-redirect/?course_id=3245044		Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais		Evandro	Evandro
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python	R\$ 0,00	Nivelar a equipe nas técnicas básicas de processamento de linguagem natural com Python. Necessária para a compreensão de temas mais complexos em NLP com Deep Learning	jun./2024	Cartaxo, André	Cartaxo, André
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai	R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento básico (alto nível) dos principais modelos de linguagem (LLMs)	jun./2024	Cartaxo, Elliackin, Jaqueline, Hildeberto	Cartaxo, Hildeberto, Elliackin, Jaqueline
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/langchain-with-python-bootcamp	R\$ 0,00	Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de LLMs por meio do framework LangChain	jun./2024	Hildeberto	Hildeberto
Ciência de Dados	LlamaIndex [4,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/llamaindex/	R\$ 0,00	Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de LLMs por meio do framework LlamaIndex	mar./2024	Hildeberto	Hildeberto
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/openai-python-api-bootcamp-learn-to-use-ai-gpt3-and-more	R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento sobre o funcionamento da API do ChatGPT	dez./2024	Elliackin	Elliackin
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]	https://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-artificial-machine-learning-guia-completo/	R\$ 0,00	Revisão geral dos conceitos de IA e ML	mar./2024	Jaqueline	Jaqueline
Ciência de Dados	Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário	Curso do CNJ	R\$ 0,00		mar./2024	Jaqueline	Jaqueline
Ciência de Dados	Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h]	https://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2029	R\$ 0,00	Capacitar a equipe do projeto de rotulagem de processos judiciais	abr./2024	Jaqueline, Cartaxo, André	Cartaxo, Jaqueline
Ciência de Dados	Curso MLflow in Action - Master the art of MLOps using MLFlow tool	udemy	R\$ 0,00	Viabilizar a concepção de um fluxo de disponibilização de modelos de IA para integração às soluções desenvolvidas	ago./2024	Jaqueline	Jaqueline
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	https://trt13br.udemy.com/course/python-for-machine-learning-data-science-masterclass	R\$ 0,00	Capacitar em profundidade todos os principais conceitos de machine learning tradicional	jun./2024	André	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO		
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x	R\$ 0,00	Capacitar em profundidade todos os principais conceitos de deep learning e redes neurais	jun./2024	Cartaxo	1	Cartaxo	1
Gestão e Governança	Curso Completo Gestão de Produto - Product management [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/	R\$ 0,00	Capacitar a equipe em conceitos gerais de gestão de produto	jun./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Breno, Ruggery	2
Gestão e Governança	Introdução ao Lean Inception [3h]	https://trt13br.udemy.com/course/inception-e-design-sprint-curso-e-treinamento/	R\$ 0,00	Fazer uma introdução sobre a metodologia Lean Inception, para nivelar o conhecimento antes do acompanhamento das Statups da 2ª chamada do Startup-JT	jun./2024	Ruggery, Breno	2	Ruggery, Breno	2
Gestão e Governança	Introdução Google Analytics [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/google-analytics-insights/	R\$ 0,00	Possibilitar a coleta de indicadores para a gestão de produtos	set./2024	Cartaxo, Ruggery, Breno	3	Ruggery, Breno	2
Gestão e Governança	Agile Trends 2024 [32h]	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2024/	R\$ 2.400,00	Congresso Nacional de Agilidade	mar./2024	Cartaxo	1	Cartaxo	1
Gestão e Governança	Scrum Product Owner [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/	R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento sobre Scrum e o papel do Product Owner	mar./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Cartaxo, Breno, Ruggery	3
Gestão e Governança	Formação de analista de processos de serviços de TI [24,5]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-iti-foundation-v3-certificacao-a-jato/	R\$ 0,00	Capacitar a equipe em gerenciamento de processos ITSM	2024	Luiz, Milton	2	Milton	1
Gestão e Governança	Gestão de Serviços de TI [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/it-service-management-bootcamp-gestao-de-servicos-de-ti/	R\$ 0,00	Capacitar a equipe na gestão de serviços de TI	2024	Luiz, Milton	2	Milton	1
Gestão e Governança	Curso OKR para Gestores e Substitutos [2,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao	R\$ 0,00	Conforme PDTIC, temos a expectativa de implantar gestão com OKR em todos os setores da SETIC em 2024	mar./2024	Bruno, Breno, Raimundo, Ewerton, Wilberto, Emerson, Gouveia, Luiz, Ericson, Ricardo, Milton, Hugo	12	Breno, Luiz, Bruno, Wilberto, Emerson, Milton, Ewerton, Gouveia	8
Gestão e Governança	Liderança Gestao de Pessoas Completo - MBA [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/lideranca-gestao-de-pessoas-completo-mba	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	Breno	1
Gestão e Governança	Gestão de Conflitos [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/gestao-de-conflito	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	Breno	1
Gestão e Governança	Soft Skills Liderança de Alto Desempenho [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	jul./2024	Breno	1	Breno	1
Gestão e Governança	Inovando na Gestão de Projetos [25h]	https://trt13br.udemy.com/course/soft-skills-lideranca-de-alto-desempenho	R\$ 0,00	Capacitar gestores e seus substitutos em liderança e gestão efetiva	ago./2024	Breno	1	Breno	1
Realizado	66,50%						200		133

Infraestrutura	49,12%
Segurança	85,71%
Desenvolvimento	67,82%
Ciência de Dados	88,24%
Gestão e Governança	75,00%

LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS
Pendência Plano	* Plano 2024 (81/2024)
Não Iniciado	* Plano 2023 (1207/2023)
Parcialmente Concluído	* Plano 2022 (853/2022)
Totalmente Concluído	* Plano 2021 (10385/2020)
	* Plano 2020 (18005/2019)

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	PROT. PRINCIPAL	RESP. TÉCNICO	RESP. ADMIN.	GRAU JURIS	BREVE JUSTIFICATIVA
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R\$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023	5793/2023	Thommas	Herika	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
2	Rede-JT - Capital Redundante (Vogel)	Cont		Vogel	Encerrar	05/08/24	05/08/24			R\$ 31.135,45	TRT13	25/2019	1368/2019	1368/2019	Thommas	Paulo Roberto	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R\$ 99.066,97	TRT13	07/2021	6059/2023	6059/2023	Helton	Herika	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)	Cont		SitecNet	Encerrar	11/08/24	11/08/24			R\$ 68.369,65	TRT13	28/2019	1368/2019	1368/2019	Helton	Paulo Roberto	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Prorrogar	14/08/24	14/02/27			R\$ 10.078,97	TRT13	10/2022	4323/2024	4323/2024	Thommas	Paulo Roberto	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Prorrogar	16/08/24	16/02/27			R\$ 12.620,19	TRT13	11/2022	4461/2024	4461/2024	Thommas	Paulo Roberto	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/24	27/07/27			R\$ 384.000,00	TRT13	29/2022	4457/2024	4457/2024	Ruber	Michel	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
8	PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST)	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/24	08/09/27			R\$ 234.298,85	TRT13	37/2022	5858/2024	5858/2024	Manuel	Michel	1º e 2º	Prevenir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
9	Suporte Infra Ágil (TRT12)	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/24	23/11/26			R\$ 30.204,32	TRT13	31/2021	8027/2024	8027/2024	Danillo	Herika	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
10	Oracle - Suporte (AN)	Cont		Oracle	Vigente	24/11/25	24/11/25			R\$ 356.087,64	TRT13	32/2021	7504/2023	7504/2023	Paulo	Paulo Roberto	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
11	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R\$ 106.538,16	TRT13	09/2021	8200/2023	8200/2023	Danillo	Herika	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
12	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte	Cont		PARS	Encerrar	23/08/24	23/08/24			R\$ 224.816,16	TRT13	27/2020	4755/2023	4755/2023	Danillo	Paulo Roberto	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
13	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	16/09/24	16/09/26			R\$ 690,37	TRT13	23/2021	5860/2024	5860/2024	Luiz Alberto	Paulo Roberto	2º	Determinação do CSJT
14	Zoom - Audiências e Sessões (CSJT)	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/24	18/02/26			R\$ 24.149,40	TRT13	05/2021	11512/2023	11512/2023	Alessandra	Paulo Roberto	1º e 2º	Determinação do CSJT
15	Adobe Cloud	Cont		Tecnetworking	Encerrar	17/05/24	17/05/24			R\$ 0,00	TRT13	15/2020	663/2023	663/2023	Epitacio		2º	Edição de vídeo e imagem para ACS
16	AutoCAD	Cont		MapData	Encerrar	25/10/24	25/10/24			R\$ 0,00	TRT13	29/2021	22112/2021	22112/2021			2º	Visualização e edição de projetos arquitetônicos
17	Antivírus	Cont		ISH	Vigente	08/08/25	08/08/25			R\$ 70.687,65	TRT13	19/2021	19251/2021	19251/2021	Milton	Herika	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
18	Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE	Cont		Certisign	Encerrar	30/09/24	30/09/24			R\$ 7.500,00	TRT13	37/2020	0734/2020	0734/2020	Alessandra		1º e 2º	Dar celeridade e desburocratizar alguns processos
19	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R\$ 816.840,96	TRT13	28/2023	1725/2023	1725/2023	Luiz Alberto		1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos usuários
20	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/24	26/06/27			R\$ 1.654,45	TRT13	24/2022	2427/2024	2427/2024	Paulo	Michel	1º e 2º	Funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br
21	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/24	18/08/26			R\$ 4.737,61	TRT13	33/2022	5280/2024	5280/2024	Emerson	Michel	2º	Ferramente de análise de dados
22	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/24	09/10/33			R\$ 6.800,00	TRT13	43/2023	6922/2024	6922/2024	Marcelo/Ronaldo	Não há	1º e 2º	Uso de práticas inovadoras e emergentes nas oficinas
23	Google Workspace (TRT02)	Cont		RJR/RW3	Vigente	20/06/25	20/12/27			R\$ 362.846,25	TRT13	40/2022	25620/2021	25620/2021	Wilberto	Michel	1º e 2º	Contrato irá vencer sem possibilidade de renovação
24	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021	28043/2021	Wilberto	Michel	1º e 2º	Prevenir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
25	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R\$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023	1330/2023	Mafra	Michel	1º e 2º	ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.º 132/2022
26	CDN - Content Delivery Network (TRT04)	Cont		Claro	Vigente	26/09/25	26/09/27			R\$ 114.456,96	TRT13	43/2022	30851/2021	30851/2021	Wilberto	Paulo Roberto	1º e 2º	Camada extra de segurança para os serviços Web
27	ITSM (TRT24)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28			R\$ 525.005,17	TRT13	38/2023	4217/2023	4217/2023	Milton	Roberto	1º e 2º	Sanar vulnerabilidades e recomendações de auditorias
28	IntelliJ	Cont		Cyber Wan	Vigente	02/10/25	02/10/27			R\$ 0,00	TRT13	37/2023	2227/2023	2227/2023			2º	Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e improdutivas
29	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/24	16/11/33			R\$ 3.375,00	TRT13	48/2023	7128/2024	7128/2024			2º	Design gráfico e banco de imagens
31	Rede-JT - Capital Redundante	1	Concluído	Sitecnet	Licitação	07/01/27	07/07/34			R\$ 9.145,16	TRT13	22/2024	1215/2024	1215/2024	Thommas	Roberto	1º e 2º	Imprescindível a comunicação do TRT13ª
32	Rede-JT - Interior Redundante	1	Concluído	Sitecnet	Licitação	11/02/27	11/08/34			R\$ 32.167,74	TRT13	23/2024	1215/2024	1215/2024	Helton	Roberto	1º e 2º	Imprescindível a comunicação do TRT13ª
37	Adobe Cloud (TRT22)	1	Concluído	MCR	Coparticip	22/04/27	22/04/27		R\$ 49.800,00		TRT13	11/2024	2166/2024	2166/2024			2º	Edição de vídeo e imagem para ACS
36	AutoCAD (TRT22)	1	Tramitação Administrativa		Coparticip				R\$ 101.486,67		TRT13		7054/2024	7054/2024			2º	Visualização e edição de projetos arquitetônicos
34	Emissão de Certificados Digitais A3 (TRT16)	1	Concluído	Certisign	Coparticip	12/09/29	12/09/34			R\$ 3.750,00	TRT13		6577/2024	6577/2024			1º e 2º	Certificados digitas A3 para servidores e magistrados
35	Firewall (TRT12)	1	Concluído	NTSec	Coparticip	16/04/26	16/04/26		R\$ 1.336.768,00		TRT13	10/2024	2703/2024	2703/2024	Adriana		1º e 2º	Segurança de nossa rede
30	Material de Consumo de TIC	1	Concluído		Licitação				R\$ 7.304,04		TRT13		1996/2024	1996/2024			1º e 2º	Necessário para atividades de rotina da SETIC
46	Suporte Servidores Blade (Nacional)	1	Concluído	Newsupri	Licitação Nac.					R\$ 0,00	CSJT	44/2019	1197/2024	1197/2024			1º e 2º	Garantia de disponibilidade dos servipos
47	Roteadores para Link de Dados	1	Concluído		Licitação			R\$ 32.880,00			TRT13		2259/2024	2259/2024			1º e 2º	Roteadores atuais sem suporte acima de 200 Mbps
45	Extensão de garantia switches SAN (TRT18)	1	Concluído	Hardlink	Coparticip	04/03/27	04/09/29			R\$ 447,33	TRT13	32/2024	7053/2024	7053/2024	Ruber	Michel	1º e 2º	Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garanti
48	Extensão de garantia servidores rack (TRT18)	1	Concluído	Servix	Coparticip	12/11/27	12/11/27			R\$ 58.000,00	TRT13	33/2024	7072/2024	7072/2024	Ruber		1º e 2º	Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garanti
68	Infraestrutura de IA	1	Licitado	Plugnet	Licitação			R\$ 281.935,00			TRT13		7625/2024	7625/2024			2º	Recurso essencial para desenvolvimento dos projetos do LAIS
51	Dockstation para Notebooks	1	Tramitação Administrativa		Licitação			R\$ 25.440,00			TRT13		5861/2024	5861/2024			2º	Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido, permite re
53	Fones de ouvido com redução de ruído	1	Tramitação Administrativa		Licitação			R\$ 6.231,24			TRT13		10077/2024	10077/2024			2º	Necessidade de equipamentos para realização de reuniões rem
61	Telas Interativas - Presidência, Labor e Ejud	1	Tramitação Administrativa		Licitação			R\$ 116.682,54			TRT13		8158/2024	8158/2024			2º	Melhorar a qualidade das apresentações e reuniões na presidê
39	Storage (TST)	1	Contrato Assinado	JAMC	Coparticip			R\$ 1.920.000,00	R\$ 144.000,00		TRT13		8063/2023	8063/2023			1º e 2º	Garantir desempenho e disponibilidade dos serviços
42	Solução de conscientização de segurança (TRT4)	1	Tramitação Administrativa		Coparticip				R\$ 27.316,26		TRT13		7774/2023	7774/2023			1º e 2º	Mitigar o risco de ataques usando a desinformação
52	Notebooks	1	Tramitação Administrativa		Adesão			R\$ 299.750,00			TRT13		9717 /2024	9717 /2024			1º e 2º	Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido
72	Subscrições Oracle Linux	1	Tramitação Administrativa		Licitação				R\$ 602.271,71		TRT13		9650/2024	9650/2024	Wilberto		1º e 2º	Prover a infraestrutura para criação de backup em local distint
71	Fibra apagada JFPB	1	Aguardando coparticipação		Coparticip					R\$ 4.000,00	TRT13		9573/2024	9573/2024	Helton		1º e 2º	Prover a infraestrutura para criação de backup em local distint
38	Microcomputadores (TRT23)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 1.986.526,00			CSJT		8041/2024	8041/2024			1º e 2º	Substituição de equipamentos fora de garantia
43	Roteadores de Internet (TRT03)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 308.102,78	R\$ 39.145,66		CSJT		8210/2023	8210/2023			1º e 2º	Roteadores atuais lentos e irão perder garantia. Equipamentos
40	Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 654.674,00	R\$ 27.500,00		CSJT		8062/2023	8062/2023			1º e 2º	Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribunal
41	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 755.346,48		CSJT		8182/2023	8182/2023			1º e 2º	Segurança de nossa rede
44	Ativos de Rede - Switches (TRT24)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 850.000,00			CSJT		8209/2023	8209/2023			1º e 2º	Switches atuais estão obsoletos e sem garantia. Equipamentos
65	Solução de Atualização dos Portais	1	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 375.000,00			CSJT						1º e 2º	Melhorar a acessibilidade e segurança da atual solução
60	Análise de Segurança de Código Fonte	2	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 176.000,00	TRT13						2º	Verificação automática de segurança das aplicações desenvol
57	Degração do Áudio das Audiências - SEGEJUD	2	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 120.000,00		TRT13						1º	Otimização das rotinas de trabalho e facilitar a localização de t
66	Solução de Stream para Lives	2	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 13.000,00	TRT13						2º	Aquisição de software para realização de lives
67	Google Duet AI	2	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 90.000,00	TRT13						2º	IA integrada ao Google para tarefas nas aplicações das ferram
70	Impressoras	2	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 90.000,00		TRT13						2º	Criação de ilhas de impressão. Impressoras atuais fora de gara

56	Solução de trabalho no IOS	2	Aguardando Prioridade	Licitação						TRT13						2º	Necessário para criação de apps para iPhone
69	Extensão de garantia storage (TRT18)	3	Aguardando Prioridade	Coparticip				R\$ 211.276,78	CSJT		8024/2023	8024/2023				1º e 2º	Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garanti
63	SIABI (SaaS) - Continuado	3	Aguardando Prioridade	Compra Direta				R\$ 27.000,00	TRT13		4576/2023	4576/2023				2º	Contrato não permite mais prorrogação.
64	Oracle em Nuvem	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13							1º e 2º	Melhor modelo de negócio na nuvem
59	Solução de acessibilidade para pessoas cegas (ALIA v2)	3	Aguardando Prioridade	Licitação				R\$ 265.440,24	TRT13		2261/2024	2261/2024				1º e 2º	Criação do novo protótipo para o ALIA junto ao IFPB
TOTAL								R\$ 6.857.221,56	R\$ 3.566.379,06	R\$ 4.337.705,23							
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)								R\$ 2.682.918,78	R\$ 2.268.946,68	R\$ 107.510,23							
LIQUIDADO (Fonte TRT13 e Prioridade 1)								R\$ 32.880,00	R\$ 1.393.872,04	R\$ 103.510,23	30,25%						

Total Incluído no PAAC	#REF!
Total Removido do PAAC	#REF!
Saldo	#REF!

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2024 (81/2024)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* CGOVTIC 2023 (1207/2023)	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* CGOVTIC 2022 (853/2022)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* CGOVTIC 2021 (19338/2021)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

* PAAC 2024 - PROAD 4247/2023

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	CONCLUÍDO
Governança	Ação	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	dez./2023	set./2023	Sim
Atendimento	Projeto	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	dez./2023	dez./2023	Sim
Atendimento	Projeto	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	dez./2023	nov./2023	Sim
Atendimento	Projeto	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	dez./2023	nov./2023	Sim
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	mar./2023	mar./2023	Sim
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do app SIGEP-JT	jun./2023	fev./2023	Sim
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	jul./2023	jul./2023	Sim
Sis. Nacionais	Projeto	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	set./2023	out./2023	Sim
Sis. Locais	Ação	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	mar./2023	mar./2023	Sim
Sis. Locais	Projeto	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	jun./2023	mai./2023	Sim
Sis. Locais	Projeto	Acessibilidade dos Portais	jul./2023	jul./2023	Sim
Sis. Locais	Projeto	Criação de aplicativo para realização de inventário	set./2023	set./2023	Sim
Sis. Locais	Ação	Aprimoramento do Portal do PJE	out./2023	out./2023	Sim
Seg. Cibernética	Ação	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	dez./2023	nov./2023	Sim
Sis. Nacionais	Projeto	Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe	dez./2024		Não
Sis. Nacionais	Ação	Implantação robôs do solaria (RJ9)	set./2024	jul./2024	Sim
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)	set./2024		Não
Sis. Locais	Projeto	SEGEPE - Meu portal	dez./2024		Não
Inteligência Artificial	Ação	Experimentos para geração da ementa dos votos com LLMs open-source	dez./2024		Não
Inteligência Artificial	Ação	Mapeamento dos autotextos relativos a cada pedido da inicial	dez./2024		Não



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Revisão do processo de gerenciamento de portfólio e projetos de TIC	iGovTIC-Jud	Mai/2024	Jun/2024	Concluído	OE09	OE05
Melhoria no monitoramento do PDTIC (Contratos)	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Abr/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para revisão	iGovTIC-Jud	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para auditoria	RDI 127/2022	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Processo para disponibilização dos artefatos de contratação de TIC em repositório nacional e portal do TRT13	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Jun/2024	Jul/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento de incidentes	CITSmart	Jun/2024	Out/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisão do processo de cumprimento de requisições	CITSmart	Jun/2024	Out/2024	Concluído	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços de TIC	CITSmart	Jun/2024	Jun/2024	Concluído	OE09	OE05
Elaboração da pesquisa de satisfação com os serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Nov/2024		Em andamento	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento do conhecimento de TIC	CITSmart	Nov/2024		Em andamento	OE09	OE05
Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Capacidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Gerenciamento de Disponibilidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Eventos de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Revisar a política de pessoas de TIC	iGovTIC-Jud	2024		Aguardando prioridade	OE09	OE03
Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC)		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Problemas		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Continuidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Cumprimento de Requisições		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Mudanças		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Elaborar o processo de transformação digital		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

	Em andamento
	Priorizado
	Adicionado
	Alterado
	Executado
